Руководитель
регионального проекта —
Кузнецов Александр Игоревич
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

_____
(подпись)

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

**Сертификат:**
**1145F15EB788A826C2F490E12C35663F0A89CEE9**

**Владелец: Кузнецов Александр Игоревич**

**Действителен: с 07.10.2019 по 07.01.2021**

04.10.2020

ОДОБРЕН

_____

# О Т Ч Е Т

## О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

*"(Е5-75) Учитель будущего (Челябинская область)"*

### Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| *Отсутствие отклонений* | *Отсутствие отклонений* | *Отсутствие отклонений* | *Отсутствие отклонений* | *Отсутствие отклонений* |

_____

## 1. Ключевые риски

| № п/п | Статус | Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|---|---|---|---|---|
| *Отсутствуют ключевые риски* | | | | |

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1 | | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Процент | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5 | 5 | 56,00% | достижение показателя запланировано на декабрь 2020г. |
| 2 | | Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 1.1765 | 0,00% | Открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО) состоялось 30.09.2020 г.Открытие центра ОГБУ ЧЦОПМКП запланировано на декабрь 2020г. |
| 3 | | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0,00% | достижение показателя запланировано на декабрь 2020г. |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

## 3. Статус исполнения бюджета[2]

Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 86 446,20 тыс. руб




Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено  Риски исполнения  Остаток финансовых средств

[2] При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

## Сведения об исполнении бюджета

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | *(06) Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации* | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 100,00 | |
| 1.1 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 100,00 | |
| 1.1.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 100,00 | |
| 1.1.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3 | | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 100,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 100,00 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 86 446,20 | 100,00 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

## 4. Статус достижения результатов

| № п/п | Статус | Наименование результата | Достижение контрольных точек |
|---|---|---|---|
| 1 | | Обеспечено участие педагогов Челябинской области во всероссийских и областных конкурсах работников образования<br>Значение: 10,0000 Дата: 30.12.2020 | |
| 2 | | Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования<br>Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020 | |
| 3 | | Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации<br>Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020 | |

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

### Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

| № п/п | Уровень контроля[3] | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| 1. | | | *Обеспечено участие педагогов Челябинской области во всероссийских и областных конкурсах работников образования Значение: 10, на дату 30.12.2020* | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Кузнецов А. И. | Информация по значению результата: В работе.в работе<br><br>Предоставлена информация : 0 из 10. |
| 1.1. | ПК | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Кузнецов А. И. | В работе.<br>Документы на согласовании |
| 1.2. | ПК | | Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Кузнецов А. И. | В работе.<br>Документы в работе |
| 2. | | | *Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования Значение: 5, на дату 31.12.2020* | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Кузнецов А. И. | Информация по значению результата: В работе.Мероприятия реализуются в соответствии графиком<br><br>Предоставлена информация : 2.8 из 5. |
| 2.1. | ПК | | Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Кузнецов А. И. | В работе.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О проведениив 2019-2025 годах областного конкурса "Учитель года"" Губернатор челябинской области от 06.03.2019г. №47, приложен файл.<br>2. "Об организации и проведении областного конкурса "Учитель года-2019"" Министерство образования и науки Челябинской области от 13.02.2019г. №01/487, |

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля[3] | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| | | | | | | | приложен файл.<br>мероприятия реализуются |
| 2.1.1 | ПК | | Более 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Кузнецов А. И. | В работе.<br>В настоящее время обеспечено выполнение 2,8 процентов, реализация мероприятия продолжается |
| 2.2. | ПК | | Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2020 | 26.03.2020 | Кузнецов А. И. | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об итогах XI областного конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный» в 2020 году" Приказ Министертсва образования и науки Челябинской области от 26.03.2020г. №01/921, указана ссылка. |
| 2.2.1 | ПК | | Проведение областного конкурса «Учитель года» в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 30.12.2020 | 12.02.2020 | Выдря Н. М. | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об организации и проведении областного конкурса «Учитель года-2020»" Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2020г. №01/384 , указана ссылка. |
| 2.2.2 | ПК | | Проведение областного конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный» в порядке, установленном Губернатором | 30.12.2020 | 26.03.2020 | Моисеева С. А. | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Об итогах XI областного конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный |

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля[3] | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| | | | Челябинской области | | | | классный» в 2020 году" Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 26.03.2020г. №01/921, указана ссылка. |
| 3. | | | *Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации Значение: 2, на дату 31.12.2020* | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Кузнецов А. И. | Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы:<br>1. ""О создании областного государственного учреждения "Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов"" Распоряжение Правительство Челябинской области от 17.01.2020г. №17-рп, приложен файл.<br>2. ""О внесении изменений в структуру управления и штатное расписание ГБУ ДПО ЧИППКРО"" Иное Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования от 29.11.2019г. № 832, приложен файл.<br>В работе<br><br>Предоставлена информация : 2 из 2. |
| 3.1. | ПК | | Осуществлена государственная регистрация организации | 31.12.2020 | 01.04.2020 | Кузнецов А. И. | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "Свидетельство о постановлке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения" Иное Федеральной налоговой службы от 01.04.2020г. № 745145119/745101001, приложен файл. |
| 3.2. | ПК | | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | 31.12.2020 | 25.05.2020 | Кузнецов А. И. | Выполнено.<br>Подтверждающие документы:<br>1. "О предоставлении субсидии на иные цели создание центров непрервного повышения профессионального мастерства и центров оценки профессионального |

---

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

| № п/п | Уровень контроля[3] | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | план | факт/прогноз | | |
| | | | | | | | мастерства и квалификаций" Соглашение Министерства образования и науки Челябинской области от 25.05.2020г. №573, приложен файл. |
| 3.3. | ПК | | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Кузнецов А. И. | В работе.<br>В работе |

_____

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

**Динамика достижения контрольных точек**

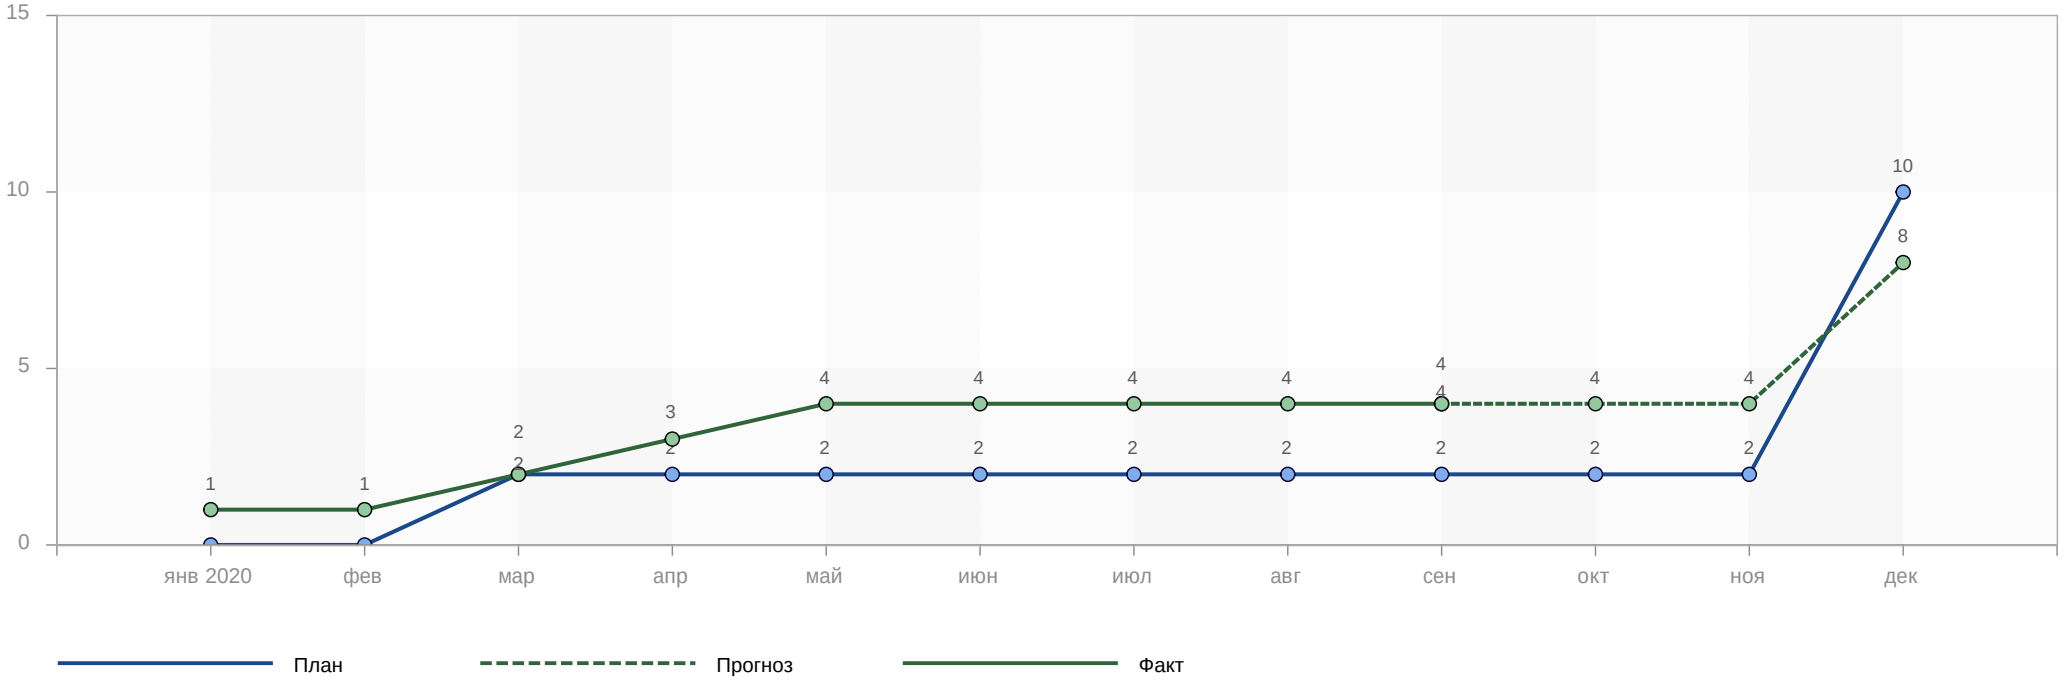


Рис. 1. *"(E5-75) Учитель будущего (Челябинская область)"*

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

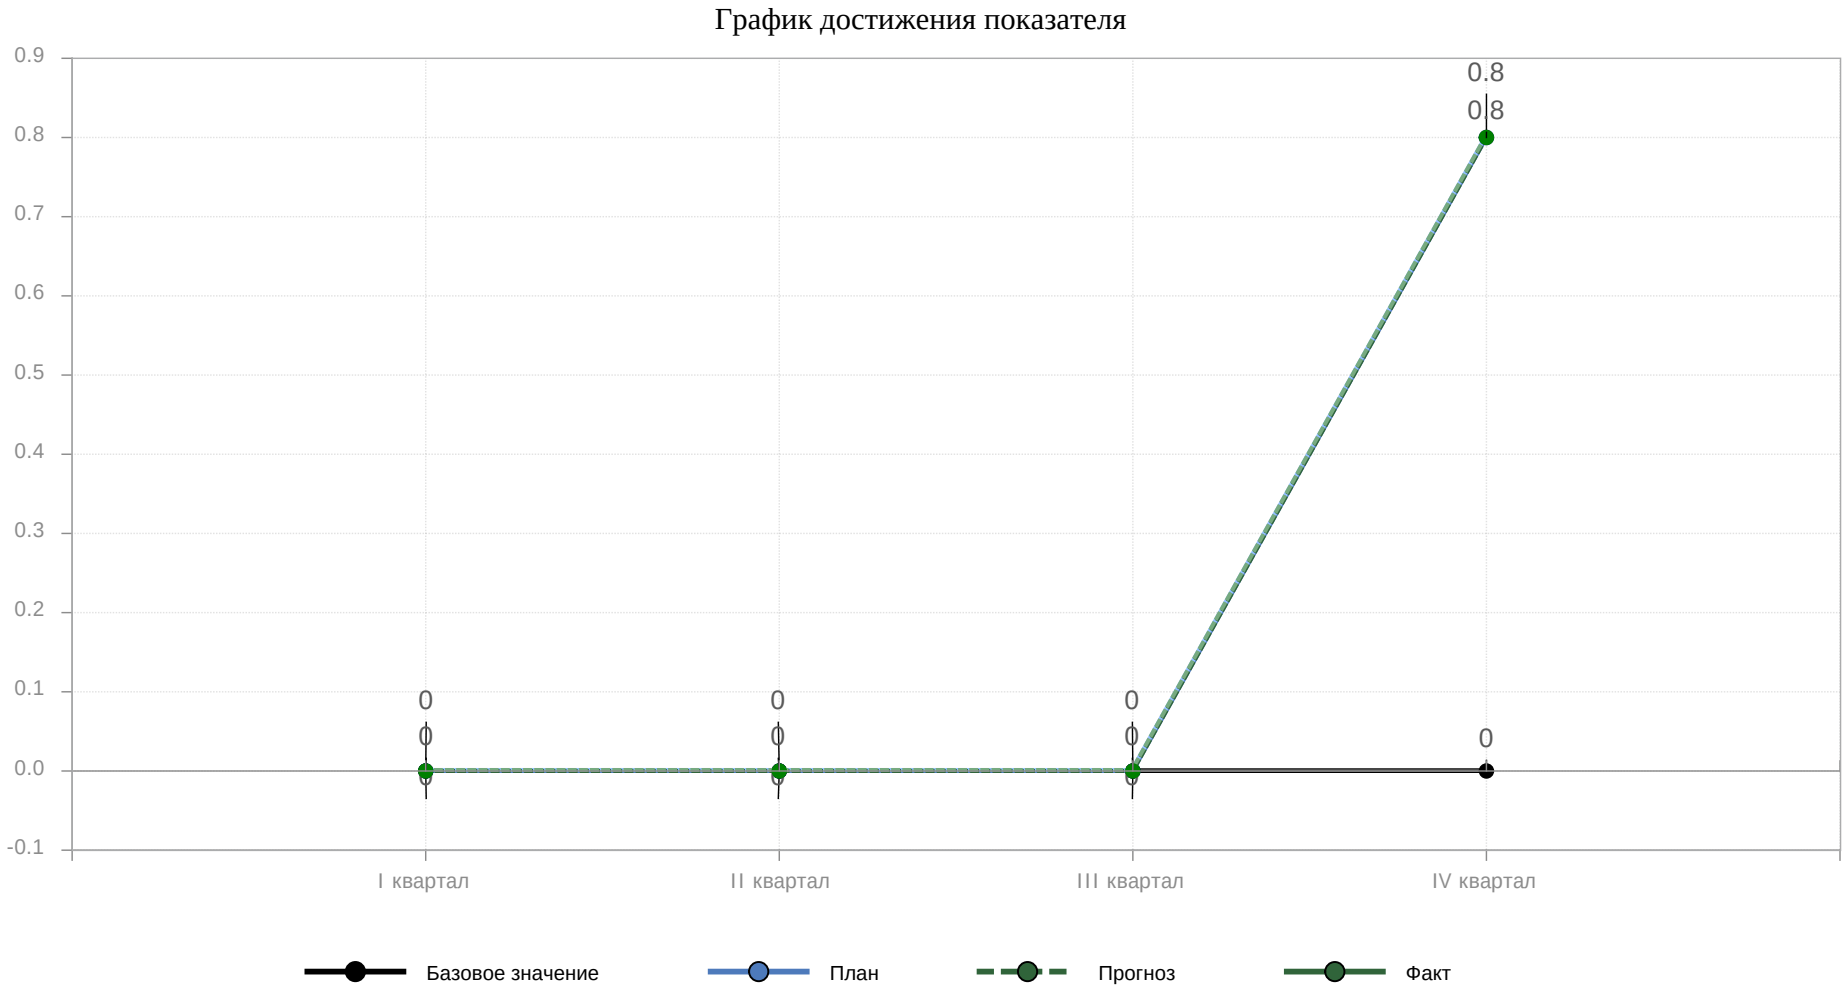


Рис. 1. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

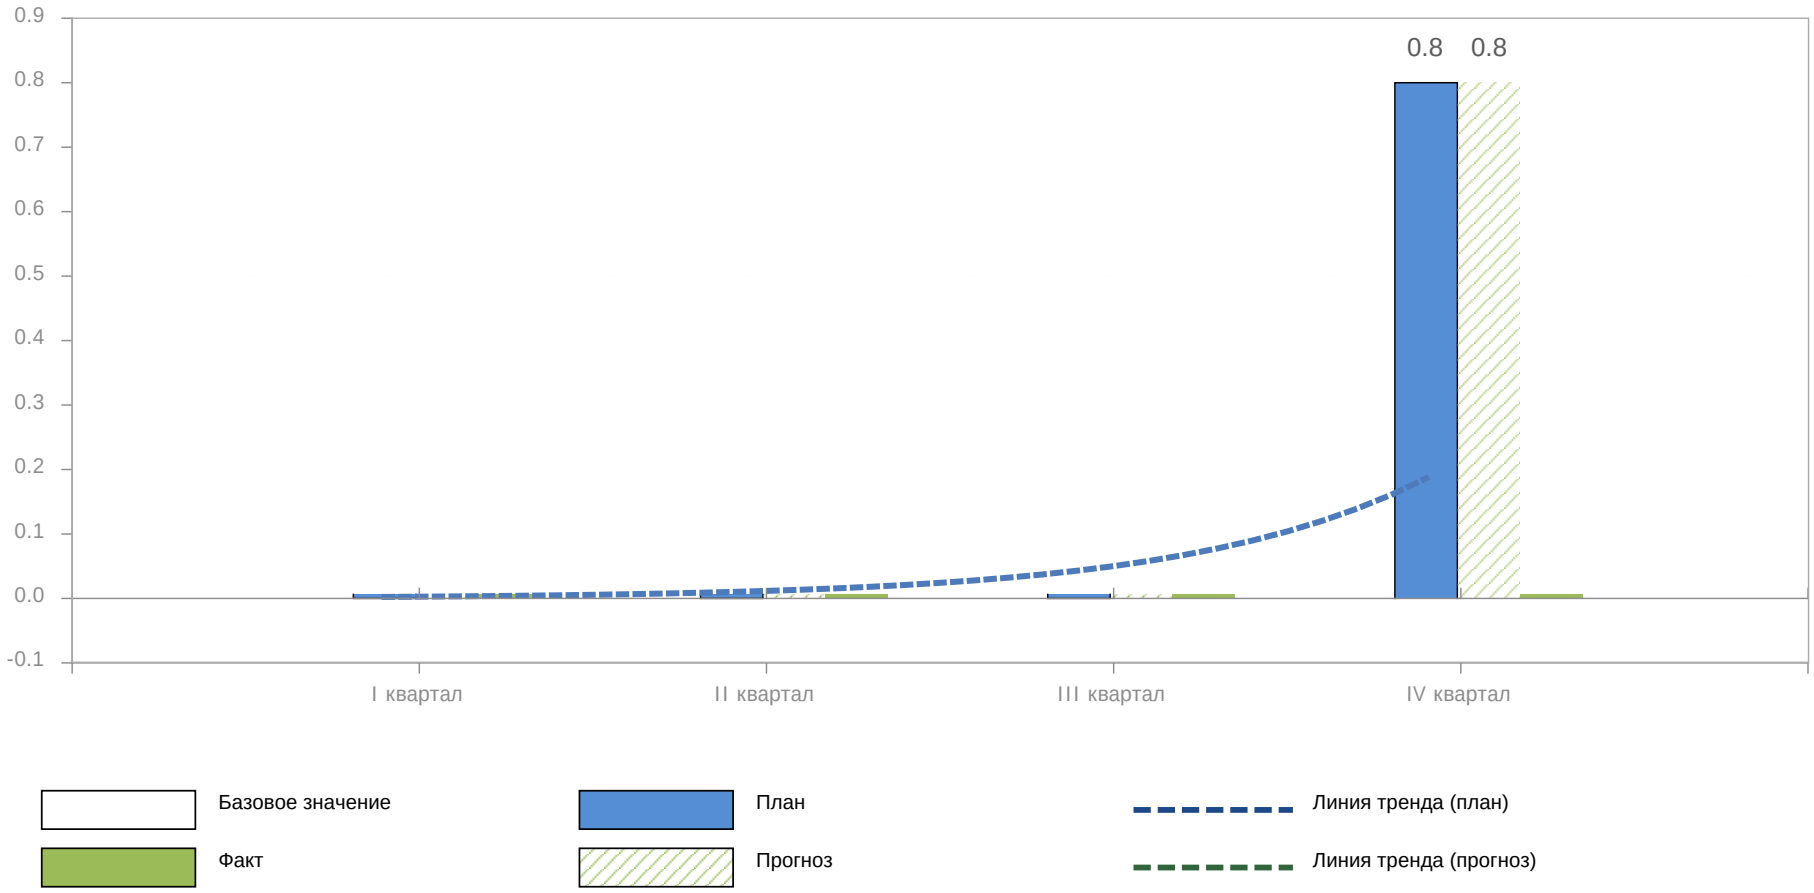


Рис. 2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

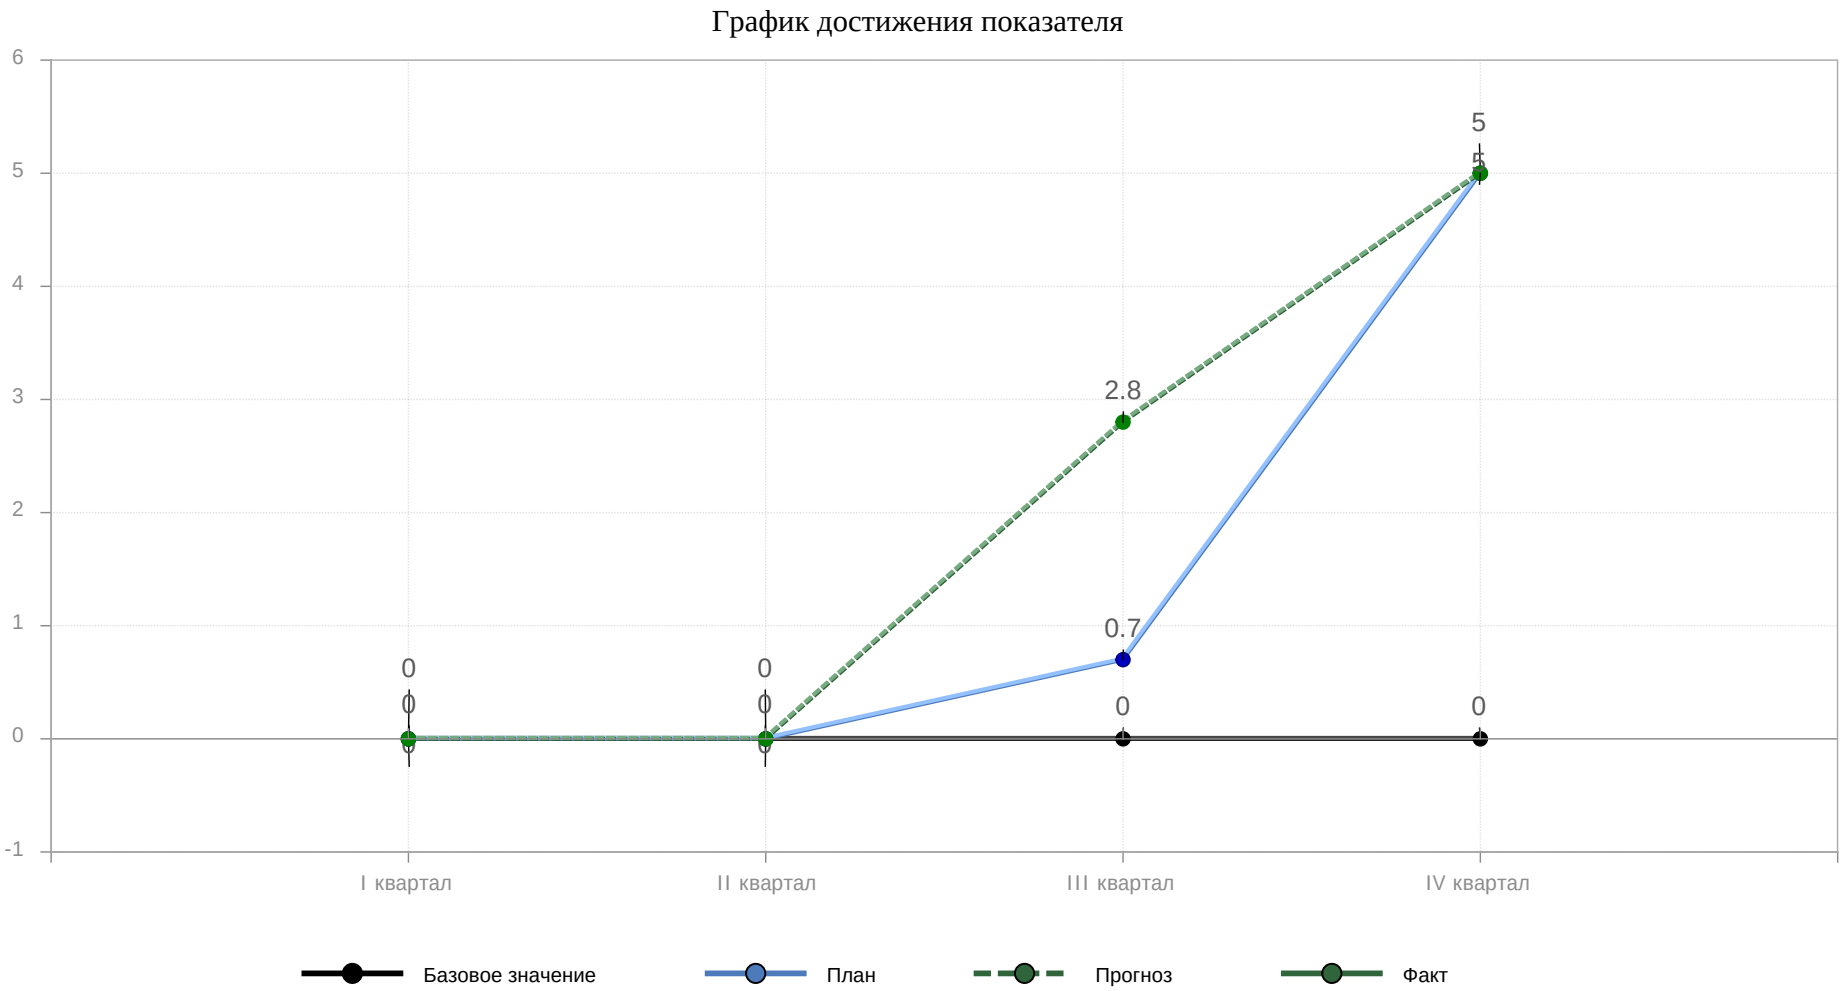


Рис. 3. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

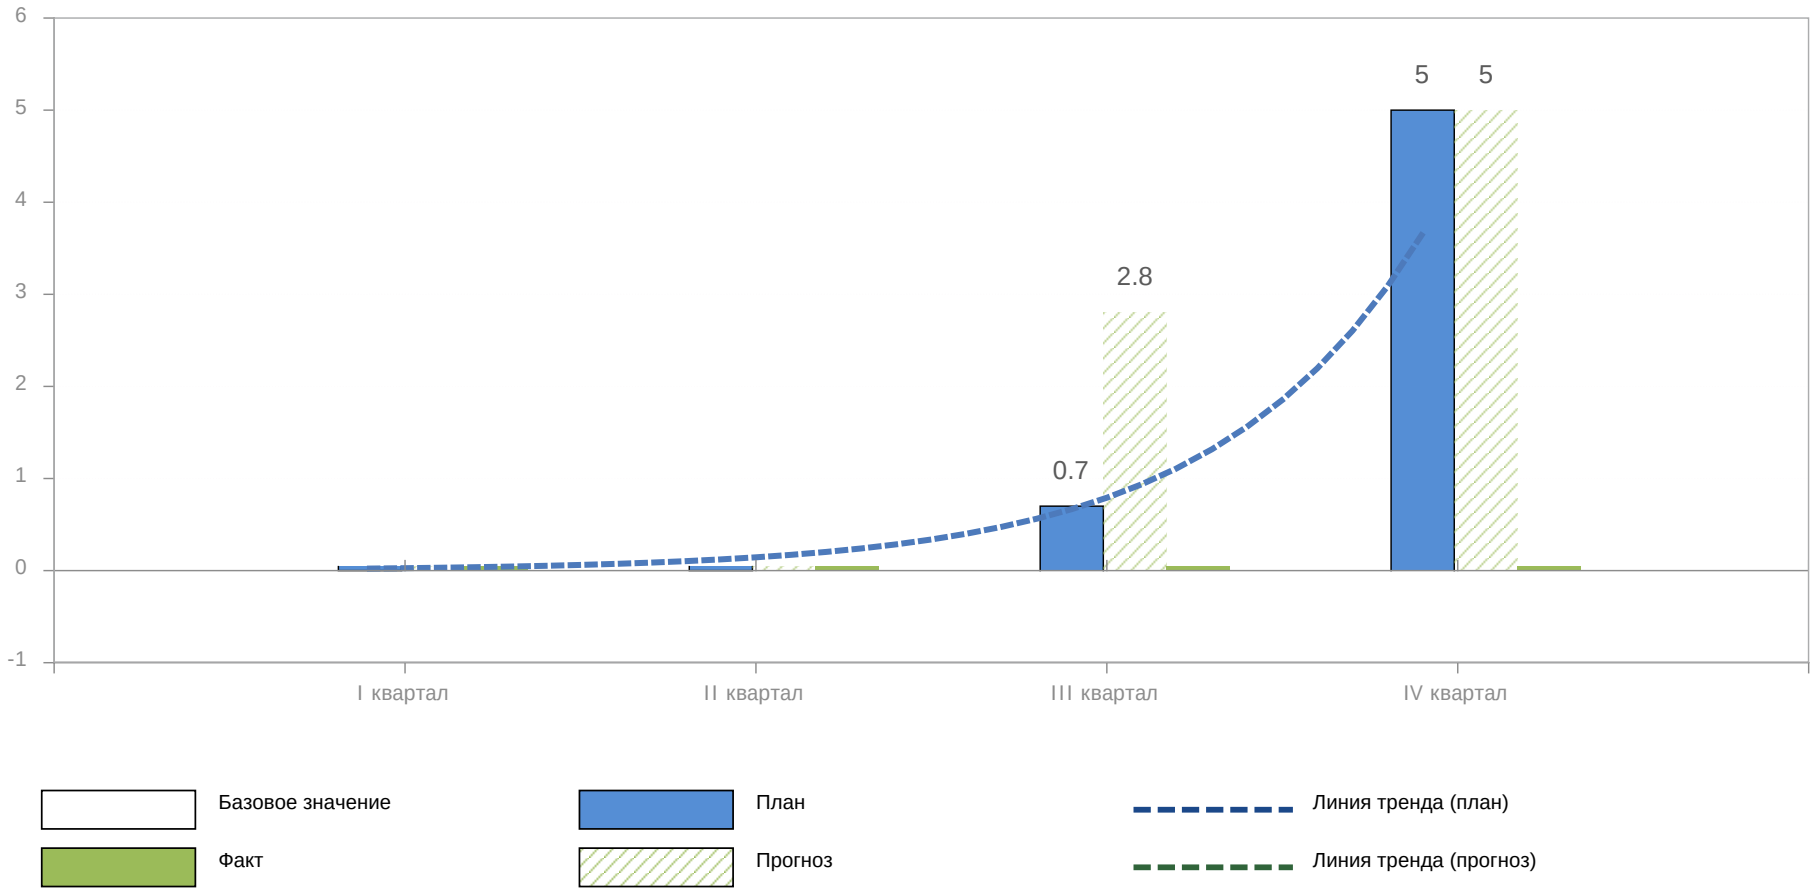


Рис. 4. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

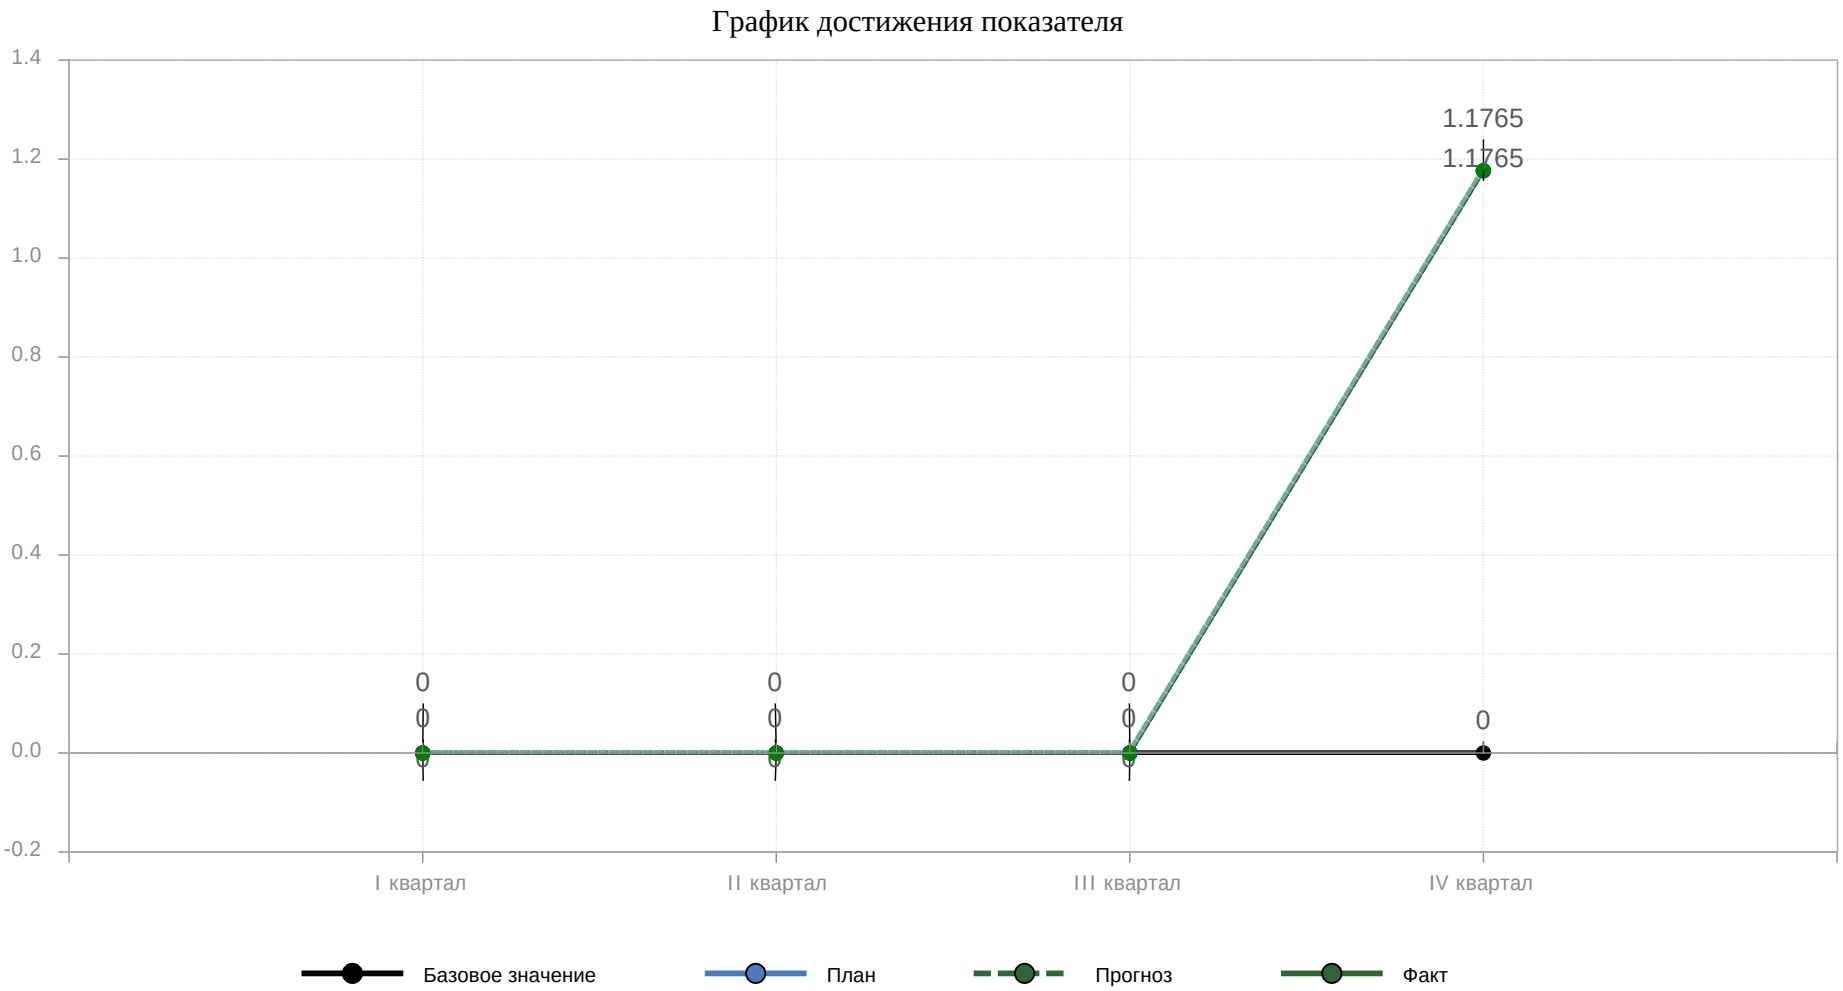


Рис. 5. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

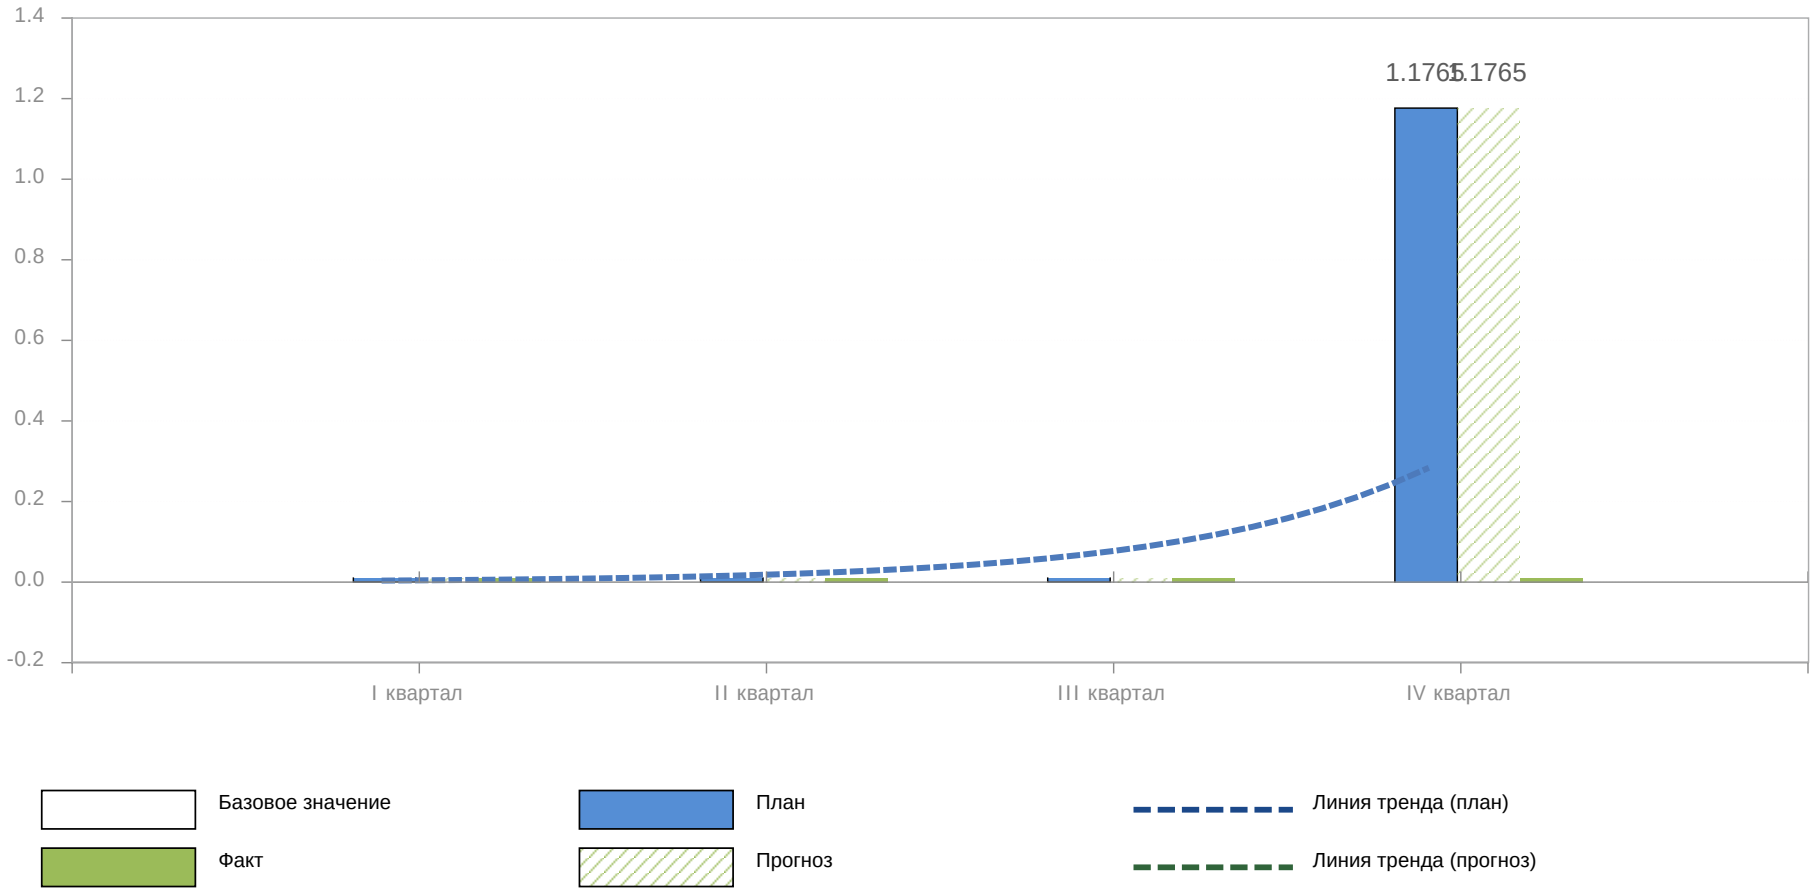


Рис. 6. Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
